

Studienprojekt Dokumentation

Gefahren im Internet
Implementierung einer interaktiven Lernplattform



Fenja Neubauer
HAW Landshut
29.09.2026

Inhaltsverzeichnis

1 Überblick	3
2 Meine Rolle im Projekt	4
2.1 Initiierung der Schulkooperation	4
2.2 Zentrale Aufgaben	4
3 Tatsächlicher Verlauf	5
3.1 Planung	5
3.2 Umsetzung & Entwicklung der Systemkomponenten	5
4 Zusammenarbeit im Team	7
4.1 Aufgaben- und Rollenverteilung im Team	7
4.2 Herausforderungen in der teaminternen Kommunikation	7
4.3 Lösungsansätze im Projektalltag	7
5 Zusammenarbeit mit der Schule	9
5.1 Test-Workshop und Schülerfeedback	9
6 Herausforderungen und Lösungsansätze	11
6.1 Unregelmäßige Erreichbarkeit und Verbindlichkeit im Team	11
6.2 Zeitlicher Druck und Motivationstief in der Prüfungsphase	11
6.3 Zeitliche Verzögerung bei der Systemintegration vor der Testphase	12
7 Postersymposium	13
8 Fazit und Ausblick	14

1 Überblick

Von März bis September 2026 habe ich gemeinsam mit vier weiteren Studierenden am Studienprojekt „Gefahren im Internet - Implementierung einer interaktiven Lernplattform“ gearbeitet. Ziel des Projekts war die Entwicklung einer Web-Applikation, mit der Schülerinnen und Schüler zwischen 12 und 14 Jahren auf spielerische Weise lernen, welche Gefahren im Internet bestehen und wie sie sich davor schützen können. Begleitet wurde das Projekt fachlich durch Prof. Dr. Christopher Auer sowie durch Herrn Christoph Steer, einer Lehrkraft der Schule, an der wir die Anwendung später mit der eigentlichen Zielgruppe getestet haben.

Innerhalb des Teams bestand meine Rolle aus dem Projektmanagement sowie der Kommunikation zu den Betreuern und im Team. Im Verlauf des Projekts habe ich mich zusätzlich an der Backend-Entwicklung beteiligt. In der vorliegenden persönlichen Dokumentation beschreibe ich, wie ich das Projekt aus meiner eigenen Perspektive erlebt habe: Welche Aufgaben in meinem Verantwortungsbereich lagen, wie sich die Zusammenarbeit im Team und mit der Schule gestaltet hat, und welche Erfahrungen und Erkenntnisse ich für mich aus den vergangenen Monaten mitnehme.

2 Meine Rolle im Projekt

Die Verantwortung innerhalb unseres Teams war klar aufgeteilt, um die verschiedenen Bereiche des Projekts effizient abzudecken. Während der Schwerpunkt der Frontend-Entwicklung bei Herrn Preitenwieser lag, mit tatkräftiger Unterstützung durch Frau Malkoc, verantwortete Frau Weber die Architektur und Entwicklung des Backends. In diesem technischen Bereich unterstützte ich sie gemeinsam mit Herrn Fuchs bei der Umsetzung einzelner Logiken, Schnittstellen und Datenstrukturen.

Neben meinen Entwicklungsaufgaben im Backend lag der Hauptfokus meiner Rolle im organisatorischen Projektmanagement. Ich war zentral für die interne Teamkoordination, die Strukturierung der Arbeitsabläufe sowie die externe Kommunikation mit unseren Stakeholdern verantwortlich.

2.1 Initiierung der Schulkooperation

Ein bedeutender Meilenstein im Projektverlauf war die Etablierung unserer Testphase im schulischen Umfeld. Durch meinen bestehenden Kontakt zu meinem ehemaligen Informatiklehrer, Herrn Christoph Steer, konnte ich eine wertvolle Kooperation mit dem Karl-Ritter-von-Frisch-Gymnasium in Moosburg aufbauen.

Auf dieser Basis übernahm ich die vollständige Konzeption, Organisation und Durchführung der Testphase. Dies umfasste sowohl die inhaltliche Ausgestaltung der Testaufgaben als auch die terminliche und organisatorische Abstimmung mit der Schule. Durch diese Zusammenarbeit erhielten wir die Möglichkeit, unsere Anwendung direkt mit zwei 7. Klassen zu testen und fundiertes, praxisnahes Feedback für die zielgruppengerechte Weiterentwicklung einzuholen.

2.2 Zentrale Aufgaben


Um einen reibungslosen Ablauf und die Einhaltung unserer Meilensteine sicherzustellen, war ich für die Erstellung und kontinuierliche Pflege des Projektzeitplans verantwortlich. Ich habe ebenfalls die Planung und Moderation der regelmäßigen Team-Meetings übernommen.

Ein zentraler Bestandteil meiner Aufgabe war es, die Einhaltung von Fristen und Absprachen aktiv nachzuverfolgen. Durch kontinuierliches Einfordern von Rückmeldungen und konsequentes Nachhaken bei Verzögerungen habe ich sichergestellt, dass das Team an für uns sinnvollen Lösungen gearbeitet hat und die vereinbarte zeitliche Planung eingehalten wurde.

3 Tatsächlicher Verlauf

3.1 Planung

Zu Beginn unseres Projekts sind wir mit einem sorgfältig ausgearbeiteten und realistischen Zeitplan gestartet.

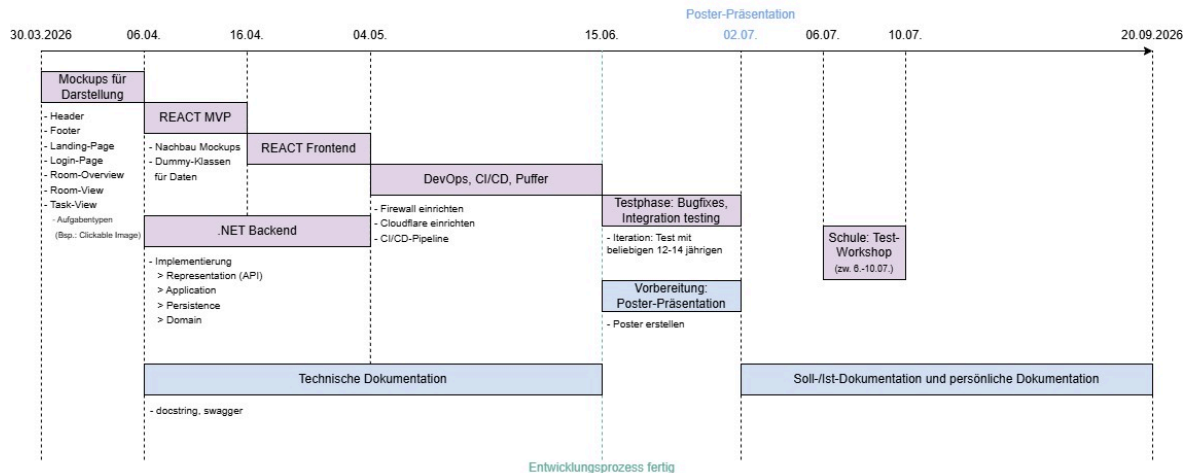

Besonders die initiale Mockup-Phase hat sich dabei als äußerst wertvoll erwiesen. Sie hat uns als Team geholfen, bereits vor den ersten Zeilen Code ein einheitliches Verständnis der visuellen und funktionalen Gestaltung der Anwendung zu entwickeln. Ein zentraler Meilenstein war hierbei ein gemeinsames Workshop-Meeting, in dem wir kollaborativ in Figma eine Website gestaltet haben, die exakt unserer Vision entsprach. Dieser erste Meilenstein verlief reibungslos und genau nach unseren Vorstellungen. Gleichzeitig nutzten wir diese Phase, um unseren eigenen Rhythmus für Meetings und Absprachen zu etablieren.

3.2 Umsetzung & Entwicklung der Systemkomponenten

Nach dem erfolgreichen Abschluss der Entwurfsphase ging es an die technische Umsetzung. Der Nachbau der Figma-Mockups im Frontend verlief sehr zügig und problemlos. Parallel dazu lag der Fokus im Backend zunächst darauf, ein solides Fundament und die grundlegende Infrastruktur aufzubauen. Diese Aufgabe übernahm Frau Weber, da die Anwendung auch über ihre Infrastruktur gehostet wird.

Da die Einrichtung einer vollautomatischen CI/CD-Pipeline (Continuous Integration / Continuous Deployment) für den Umfang unseres Projekts einen zu hohen Einrichtung- und Wartungsaufwand bedeutet hätte, entschieden wir uns für einen schlankeren, direkten Workflow. Anstelle automatisierter Deployment-Prozesse setzten wir konsequent auf manuelle Code-Reviews und Pull Requests direkt über GitHub. So konnten wir die Codequalität sicherstellen, ohne wertvolle Zeit in die komplexe Pipeline-Konfiguration zu investieren.

Nachdem die architektonischen Grundlagen von Frau Weber geschaffen wurden, intensivierten wir die Backend-Entwicklung durch gemeinsame Arbeitsmeetings zu dritt (Frau Weber, Herr Fuchs und ich). Frau Weber koordinierte dabei die Aufgabenverteilung. Dank der von ihr im Vorfeld gut strukturierten Codebase fiel die Orientierung im Projekt sehr leicht. In diesem Rahmen habe ich eigenverantwortlich verschiedene Backend-Komponenten umgesetzt – darunter die Implementierung von Services, APIs, Repositories sowie den dazugehörigen Interfaces.

Deutlich herausfordernder gestaltete sich im Anschluss jedoch die Verknüpfung von Frontend und Backend. Die Entwicklung und Abstimmung der Schnittstellen hat weit mehr Zeit in Anspruch genommen, als wir in der ursprünglichen Planung berücksichtigt hatten. Erschwerend kamen die zeitintensive Prüfungsphase sowie die parallele Organisation der bevorstehenden Testphase hinzu. Das Zusammenspiel dieser Aufgaben führte dazu, dass wir es bis zum geplanten Starttermin der Testphase nicht mehr geschafft haben, beide Systemteile vollständig miteinander zu integrieren.

In dieser kritischen Phase standen wir vor der Entscheidung, entweder den Testtermin zu verschieben oder den Durchlauf mit einer eingeschränkten Funktionalität durchzuführen. Da wir jedoch durch die nahenden Sommerferien an unseren Test-Termin gebunden waren, haben wir uns bewusst gegen eine übereilte Integration unter Zeitdruck entschieden und wählten stattdessen den Weg, die erste Testiteration auf Basis der im Frontend ausgereiften Mockups durchzuführen. Diesen Plan B hatten wir durch einen Tipp von Herrn Auer bereits früher abgesprochen und rückblickend erwies sich diese Entscheidung als absolut richtig, da wir auf diese Weise den zugesagten Zeitrahmen für die Schule einhalten konnten. Zudem haben wir durch diese erste Testiteration wichtigen Einblick in die für Schüler passende Benutzerfreundlichkeit unserer Plattform gesammelt.

Für mich in meiner Rolle als Projektmanagerin hat diese Wendung vor allem bedeutet, eine offene und ehrliche Kommunikation gegenüber unserem Ansprechpartner, Herrn Steer, zu suchen. Ich habe ihn transparent über den tatsächlichen Entwicklungsstand der Anwendung informiert und unser Vorgehen erläutert. Diese Offenheit hat sich ausgezahlt. Die Testphase verlief äußerst informativ und wertvoll, und die Schülerinnen und Schüler konnten die zentralen Ansichten sowie die verschiedenen Aufgaben umfassend testen. Die im Hintergrund noch nicht vorhandenen Datensätze haben uns und die Schüler somit nicht gestört.

4 Zusammenarbeit im Team

Die ursprüngliche Rollenverteilung hat sich im Großen und Ganzen bewährt, auch wenn wir im Projektverlauf öfter bereichsübergreifend zusammengearbeitet haben.

4.1 Aufgaben- und Rollenverteilung im Team

Frau Malkoc hat den Großteil des Designs im Frontend mit gestalterischen Arbeiten wie dem Logo übernommen und Herrn Preitenwieser zusätzlich bei der technischen Entwicklung des Frontends unterstützt. Herr Preitenwieser hat zuverlässig die Lerninhalte erarbeitet, wobei wir jedoch immer wieder Schwierigkeiten hatten, ihn zu erreichen. Er war dennoch der Erste, dessen technischer Implementierungsteil zum Testen bereit war.

Frau Weber hat sich der Architektur und der Entwicklung des Backends angenommen und wurde hierbei von Herrn Fuchs und mir unterstützt. Herr Fuchs arbeitete hauptsächlich an der Dokumentation unseres Projekts und setzte sich laufend sowohl mit mir als auch mit dem Rest des Teams für die Frontend- und Backend-Dokumentation sowie für die abschließende Soll-/Ist-Dokumentation in Verbindung.

4.2 Herausforderungen in der teaminternen Kommunikation

Die teaminterne Kommunikation gestaltete sich jedoch schwieriger, als ich zu Projektbeginn angenommen hatte. Zwei Aspekte machten mir dabei besonders zu schaffen: Frau Weber, die uns gleichzeitig den Server für das Hosting bereitstellte, war häufig nur schwer erreichbar und erschien wiederholt nicht zu vereinbarten Meetings. Herr Preitenwieser war grundsätzlich selten erreichbar, erledigte seine Aufgaben jedoch stets zuverlässig und in guter Qualität.

Eine zusätzliche Belastung stellte die anstehende Prüfungsphase dar. Die intensive Vorbereitungszeit ging an keinem von uns spurlos vorbei und spiegelte sich zeitweise deutlich im Ablauf des Projekts wider. In dieser Phase war es nicht leicht, die Motivation im Team aufrechtzuerhalten.

4.3 Lösungsansätze im Projektalltag

Im Fall von Frau Weber habe ich mir im Laufe der Zeit angewöhnt, bewusst mehr Termine anzusetzen, als eigentlich notwendig gewesen wären, damit sie zumindest an einem Großteil davon teilnehmen konnte. Das bedeutete für mich zusätzlichen organisatorischen Aufwand, erwies sich aber als praktikabel, sodass wir letztlich gut miteinander zurechtkamen.

Termine zu finden, an denen möglichst viele Teammitglieder teilnehmen konnten, blieb

insgesamt eine Herausforderung. Häufig entschied ich mich dafür, zwei parallele Termine anzusetzen und die jeweils andere Gruppe im Nachgang über die besprochenen Inhalte zu informieren, anstatt auf einen gemeinsamen Termin zu bestehen, an dem ohnehin nicht alle hätten teilnehmen können. Dieses Vorgehen war zwar zeitintensiver, stellte aber sicher, dass niemand vollständig außen vor blieb.

Zusätzlich hat sich eine gute Teilung in Front- und Backend ergeben, somit haben wir beispielsweise spezielle Backend-Meetings angesetzt, an denen nur Anna Weber, Lukas Fuchs und ich teilgenommen haben. Dies hat den Planungsaufwand ein wenig erleichtert, da mit nur drei Personen ein konkreter Termin gesucht werden musste.

5 Zusammenarbeit mit der Schule

Die Schule, an der wir unseren Test-Workshop durchgeführt haben, ist mein ehemaliges Gymnasium. Den Kontakt dorthin habe ich selbst hergestellt, da ich durch meine Schulzeit bereits über bestehende Verbindungen zu meinem damaligen Informatiklehrer verfügte. Diese persönliche Beziehung erleichterte die Kontaktaufnahme erheblich, da von Anfang an ein hohes Grundvertrauen bestand.

Über diesen Kontakt kamen wir mit Herrn Christoph Steer in Verbindung. Er ist stellvertretender Schulleiter sowie Informatiklehrer an der Schule und erklärte sich erfreulicherweise bereit, unser Projekt zu begleiten. Die Kommunikation mit ihm verlief nahezu durchgehend reibungslos. Vereinzelt trafen Rückmeldungen etwas verzögert ein, was sich jedoch überwiegend durch Wochenenden oder Feiertage erklären ließ und den Projektablauf zu keinem Zeitpunkt gefährdete.

5.1 Test-Workshop und Schülerfeedback

Der Test-Workshop fand am 10. Juli statt und umfasste zwei volle Unterrichtsstunden. Auch wenn die Anwendung zu diesem Zeitpunkt auf Basis der ausgereiften Frontend-Mockups lief, konnten die Schülerinnen und Schüler die zentralen Funktionen eigenständig ausprobieren und ausgiebig testen. Meine Aufgabe bestand darin, den genauen Ablauf sowohl mit Herrn Steer als auch mit Herrn Bertl, dem Fachlehrer der zweiten zur Verfügung gestellten Klasse, abzustimmen sowie gemeinsam mit dem Team die Einführung vorzubereiten. Unterstützt wurde ich am Testtag von Frau Malkoc und Frau Weber, mit denen ich den Workshop erfolgreich durchführte.

Das anschließende Feedback der Schülerinnen und Schüler fiel durchweg positiv und äußerst gewinnbringend aus. Besonders hervorgehoben wurden die hohe Übersichtlichkeit und das ansprechende Design der Plattform. Auch die Möglichkeit, die Anwendung im Darkmode zu nutzen, kam bei den Jugendlichen sehr gut an. Zudem lobten sie den bereits beachtlichen Funktionsumfang, der trotz des Entwicklungsstatus ein flüssiges und intuitives Arbeiten ermöglichte.

Neben dem positiven Zuspruch lieferten uns die Schülerinnen und Schüler wertvolle funktionale und visuelle Optimierungsvorschläge für die spätere Weiterentwicklung. So entstand die Idee, ein Punktesystem für gelöste Aufgaben zu integrieren, um den Anreiz und die Motivation weiter zu steigern. Um den Lerneffekt nachhaltig zu erhöhen, schlugen sie vor, Aufgabenpools mit zufälliger Fragenauswahl zu nutzen, beispielsweise indem aus sieben verfügbaren Fragen jeweils drei zufällig ausgewählt werden, damit Antworten nicht auswendig gelernt, sondern inhaltlich verstanden werden. Auch im Bereich Barrierefreiheit und Usability erhielten wir konkrete Hinweise: Für den Darkmode wünschten sich die Testpersonen eine hellere visuelle Rückmeldung bei richtigen Antworten, um den Erfolg der gelösten Aufgabe noch deutlicher erkennbar zu machen.

Im Anschluss an die Unterrichtsstunden gab uns auch Herr Steer eine sehr positive Rückmeldung. Er zeigte sich begeistert von unserem Projekt und bot uns an, für spätere Tests jederzeit wieder auf ihn zukommen zu können. Dies war für mich persönlich einer der schönsten Abschnitte im gesamten Projektverlauf, da sich hier deutlich zeigte, dass sich der organisatorische Aufwand rund um die Kontaktaufnahme, Terminabstimmung und Testvorbereitung in vollem Umfang gelohnt hatte.

6 Herausforderungen und Lösungsansätze

Im Verlauf unseres Studienprojekts traten sowohl auf organisatorischer als auch auf technischer Ebene verschiedene Herausforderungen auf. Als Projektmanagerin lag meine Hauptaufgabe darin, für diese Probleme frühzeitig funktionierende Lösungsansätze zu entwickeln, um den Gesamterfolg des Projekts und die Einhaltung unseres Zeitplans nicht zu gefährden.

6.1 Unregelmäßige Erreichbarkeit und Verbindlichkeit im Team

- **Herausforderung:** Eine der größten organisatorischen Hürden lag in der schwankenden Erreichbarkeit einzelner Teammitglieder. Insbesondere die unregelmäßige Teilnahme an vereinbarten Meetings erschwerte die kontinuierliche Abstimmung und Entscheidungsfindung.
- **Lösungsansatz:** Um diesen Engpässen entgegenzuwirken, habe ich die Meeting-Struktur flexibel angepasst und bewusst eine höhere Anzahl an kurzen Abstimmungsterminen angesetzt, sodass trotz einzelner Ausfälle eine ausreichende Kommunikation gewährleistet blieb. Ergänzend habe ich die meiste Zeit zwei Termine angesetzt, um die im ersten Termin nicht anwesenden Personen über den aktuellen Stand zu informieren, da die Terminfindung dadurch allgemein erleichtert wurde. Durch konsequentes Nachfassen bezüglich Fristen und Absprachen habe ich zudem die Verbindlichkeit im Team erhöhen können.

6.2 Zeitlicher Druck und Motivationstief in der Prüfungsphase

- **Herausforderung:** Eine zusätzliche Belastung stellte die anstehende Prüfungsphase dar. Die intensive Vorbereitungszeit ging an keinem von uns spurlos vorbei und spiegelte sich zeitweise deutlich im Ablauf des Projekts wider. Unter dem eigenen Prüfungsdruck weiterhin den Überblick zu behalten und das Team zu unterstützen war nicht einfach.
- **Lösungsansatz:** Ich habe versucht diese Phase verständnisvoll und dennoch, soweit es auch für mich möglich war, bestimmt durchzuführen. Wir haben die Aufgaben in kleinere Teile unterteilt, um sie in unseren Meetings immer wieder zu überprüfen. Zudem hatte ich die Prüfungstermine innerhalb des Teams vor Augen, damit wir spezifischen Personen Arbeit abnehmen oder sie entlasten konnten kurz vor den Prüfungen. Somit konnten wir die Projektziele trotz der Mehrbelastung strukturiert weiterverfolgen.

6.3 Zeitliche Verzögerung bei der Systemintegration vor der Testphase

- **Herausforderung:** Den Aufwand für die Entwicklung der Schnittstellen zwischen Frontend und Backend habe ich zu Beginn unterschätzt. Dadurch mussten wir einen Plan B für die Testphase an dem Gymnasium entwickeln.
- **Lösungsansatz:** Anstatt eine instabile oder unvollständige Gesamtapplikation auszuliefern, haben wir im Team die strategische Entscheidung getroffen, für die Erstiteration die voll funktionsfähigen Frontend-Mockups zu nutzen. Durch eine transparente und offene Kommunikation gegenüber dem externen Ansprechpartner, Herrn Steer, habe ich das nötige Vertrauen auch innerhalb des Teams für diesen Schritt bekommen. Dies ermöglichte es uns, den festen Termin einzuhalten und wertvolles Feedback zur Nutzerführung einzuholen, während die Backend-Entwicklung ohne Qualitätsverlust parallel fortgeführt werden konnte.

7 Postersymposium

Neben dem Test-Workshop zählte die Poster-Präsentation für mich zu den beeindruckenden Momenten des Projekts. Ich war sehr stolz, selbst Teil dieser Präsentation zu sein und das von Frau Malkoc und mir entworfene Poster vorzustellen. In diesem Moment ist mir noch einmal deutlich bewusst geworden, wie viel wir als Team in den vergangenen Monaten erarbeitet haben. Zudem war das Postersymposium eine gute Gelegenheit neue Kontakte zu knüpfen und auch kritische Fragen zu unserem Projekt zu beantworten. Mich hat darüber hinaus gefreut, dass am Tag der Präsentation des Posters alle Teammitglieder anwesend waren und wir somit als gesamtes Team unser Projekt vorstellen konnten. Obwohl wir thematisch nicht ganz in den Kontext der Veranstaltung gepasst haben, hatten wir so eine Möglichkeit interessierten Leuten einen Einblick in unsere Arbeit der letzten Monate zu geben.

h

Gefahren im Internet

- Implementierung einer interaktiven Lernplattform

Sarah Malkoc, Fenja Neubauer, Anna Weber, Lukas Fuchs, Lukas Preitenwieser
In Kooperation mit dem Karl-Ritter-von-Frisch-Gymnasium Moosburg




Ziel

Eine medienpädagogisch wertvolle Web-Applikation, die Schülerinnen und Schüler bei einem sicheren und reflektierten Umgang mit digitalen Medien unterstützt.

**Motivation**

Kinder und Jugendliche bewegen sich täglich im Internet und nutzen digitale Medien selbstverständlich im Schul- und Privatleben. Gleichzeitig steigen die Risiken durch Cybermobbing, Phishing-Angriffe und den unsicheren Umgang mit Passwörtern. Vielen Schülerinnen und Schülern fehlt jedoch ein praxisnaher und motivierender Zugang zu diesen Themen.

Die Webseite „ILSE – Interactive Learning System Entertainments“ verfolgt das Ziel, Wissen zu Gefahren im Internet auf spielerische und interaktive Weise zu vermitteln. Durch moderne Lernmethoden und digitale Übungen sollen Jugendliche für Risiken sensibilisiert und zu einem sicheren Verhalten im Internet befähigt werden.



Die Plattform behandelt die Themen:

- Passwortsicherheit
- Phishing-Erkennung
- Cybermobbing

Interaktive Lernmodule, Quizze und praxisnahe Beispiele fördern den nachhaltigen Lernerfolg und erhöhen die Motivation der Lernenden.

Methode

ILSE (Interactive Learning System Entertainments) wurde als webbasierte Lernplattform entwickelt, um Schülerinnen und Schüler für Gefahren im Internet zu sensibilisieren. Die Anwendung wurde mit React und TypeScript im Frontend sowie C# und Entity Framework Core im Backend umgesetzt. Die Kommunikation erfolgt über eine REST-API, während Docker eine einfache Bereitstellung der Anwendung ermöglicht.

Die Startseite bietet einen übersichtlichen Einstieg in die Themen Passwortsicherheit, Cybermobbing und Phishing. Über interaktive Lernkarten gelangen die Nutzer zu den jeweiligen Lernmodulen, in denen Inhalte durch praxisnahe Beispiele und Quizfragen vermittelt werden. Die kindgerechte Gestaltung und spielerische Aufbereitung sollen die Motivation fördern und den Lernerfolg unterstützen.



Literatur

Bergmann, Dieter et. al.: *Natur und Technik 7. Informatik*. 1. Auflage. C. C. Buchner, Bamberg, 2019.

Danksagung

Wir danken Herrn Christoph Steer (Informatiklehrer am Karl-Ritter-von-Frisch-Gymnasium Moosburg) sowie Herrn Prof. Dr. Christopher Auer (Professor an der Hochschule Landshut) für die fachliche Unterstützung, wertvolle Anregungen und die Begleitung unseres Projekts.

8 Fazit und Ausblick

Insgesamt bin ich mit dem Verlauf unseres Studienprojekts sehr zufrieden. Wir sind mit einem guten und durchdachten Plan gestartet, gerieten bei der Verknüpfung von Frontend und Backend jedoch in Verzug und mussten pragmatisch reagieren. Die teaminterne Kommunikation stellte sich als anspruchsvoller heraus, als ich zu Beginn erwartet hatte, doch wir fanden immer wieder praktikable Wege, damit umzugehen.

Die Zusammenarbeit mit der Schule und die positive Rückmeldung von Herrn Steer zählen für mich zu den größten Erfolgen des Projekts. Auch die Poster-Präsentation ist mir als eindrucksvoller Moment in Erinnerung geblieben.

Ich kann mir gut vorstellen, weiter an diesem Projekt zu arbeiten und habe von ein paar der anderen Teammitglieder ebenfalls positives Feedback über eine mögliche weitere Arbeit an der Web-Applikation bekommen.

Ich bin davon überzeugt, dass ich sowohl fachlich als auch menschlich mit sehr passenden Personen zusammengearbeitet habe. Die Erfahrungen aus dem Projektmanagement eines mehrköpfigen Teams sowie im Umgang mit Kommunikationsschwierigkeiten nehme ich als wertvolle Grundlage für zukünftige Projekte mit.
